

PLANO DO PROJETO

Iniciativa: Implantação do Módulo de Certidão Regional

Unidade Organizacional: STI/TRF2

Descrição:

Implementação de solução para emissão de certidões regionais. Trata-se de ferramenta desenvolvida com tecnologia atualizada e adaptável a diferentes sistemas processuais.

Data de Início: 28/07/2020

Data de Término: 12/09/2022

Resultado esperado:

- Emissão de certidão a partir de uma consulta de parâmetros em uma tela específica, quando a resposta de todas as fontes de dados cadastradas for negativa;
- Consulta de autenticidade da certidão: verifica se uma certidão é válida ou não;
- Análise de prováveis e retificações necessárias quando a consulta indicar que há processos que impeçam a geração automática da certidão, considerando todas as fontes;
- Liberação de certidões para disponibilidade na web: possibilita que as certidões fiquem disponíveis na web após liberação de um responsável, quando a certidão não puder ser disponibilizada automaticamente;
- Atualização de dados fixos na certidão: o modelo do texto da certidão deve ser editável para o caso de ajustes em trechos que podem causar problemas de interpretação;
- Interface de administração: possibilita parametrizações e especificações diversas relativas ao sistema;
- Emissão de Relatórios: permite que diversos dados relacionados à expedição de certidões possam ser extraídos;
- Impressão de certidão já requerida: consultar a certidão após o prazo informado para a análise de prováveis.

Alinhamento Estratégico

Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de proteção de dados.

Objetivo estratégico: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário.

Custo estimado:

O custo está associado ao valor homem x hora que será despendido por cada magistrado/servidor para a execução do trabalho.

Escopo do Projeto


- Reunião de Kick-off;
- Apresentação do protótipo;
- Configuração do ambiente de homologação;
- Apresentação da tela de Consulta;
- Apresentação da tela de Cadastro;



JUSTIÇA FEDERAL
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

- Apresentação da tela de Parâmetros;
- Apresentação da tela de Configurações Gerais e correção de erros;
- Apresentação do carregamento dinâmico do menu, a tela de configuração de perfis de usuários e o histórico de usuários para futuras auditorias;
- Apresentação da tela de Auditoria;
- Apresentação das telas de Requerimento interno de certidão e detalhamento do histórico das certidões;
- Testes de carga;
- Ajustes solicitados pela SAJ;
- Homologação pela SAJ;
- Liberação em produção.

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

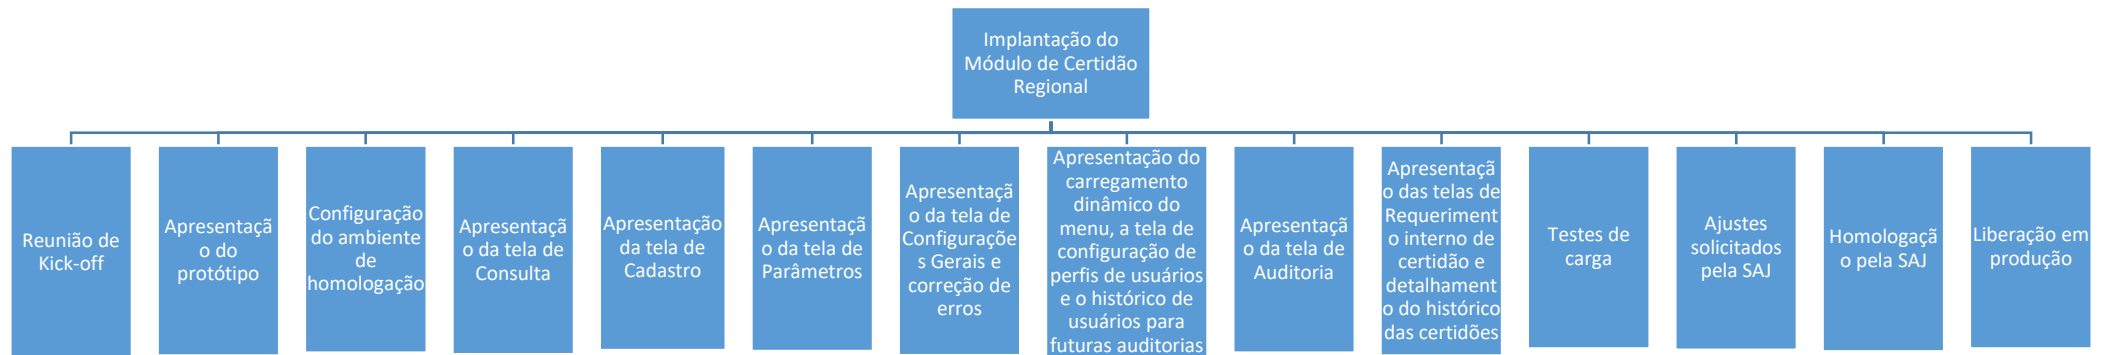



JUSTIÇA FEDERAL
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Cronograma do Projeto

Item	Entrega do projeto	Data de Início	Data de Término
1	Reunião de Kick-off		28/07/2020
2	Apresentação do protótipo		10/09/2022
3	Configuração do ambiente de homologação		24/09/2020
4	Apresentação da tela de Consulta		07/10/2020
5	Apresentação da tela de Cadastro		22/10/2020
6	Apresentação da tela de Parâmetros		11/12/2020
7	Apresentação da tela de Configurações Gerais e correção de erros		18/02/2021
8	Apresentação do carregamento dinâmico do menu, a tela de configuração de perfis de usuários e o histórico de usuários para futuras auditorias		07/06/2021
9	Apresentação da tela de Auditoria		16/06/2021
10	Apresentação das telas de Requerimento interno de certidão e detalhamento do histórico das certidões		07/07/2021
11	Testes de carga		29/09/2021
12	Ajustes solicitados pela SAJ		25/10/2021
13	Homologação pela SAJ		16/02/2022
14	Liberação em produção		01/10/2022

Observação: Foi utilizada a ferramenta Scrum para desenvolvimento dessa iniciativa. As datas de término citadas se referem a cada etapa cumprida das sprints.
